

PROMOCION DE 178 VIVIENDAS VPPA EN MÓSTOLES

FINANCIACIÓN PRTR

RESUMEN DE FEBRERO-2025



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERÍA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

INFORMACION GENERAL OBRA

FR-63 PAU-4 MÓSTOLES SUR

Superficie Parcelas	4.357,25 m2	
Superficie Construida	27363,34 m2	
Sobre rasante	19.136,50 m2	
Bajo rasante	8.226,84 m2	
Presupuesto (i/lva)	31.651.575,79 €	
Inversión total actuación	32.746.308,50 €	
Plazo	26	
Contratista		178
N. Viviendas	2D	14
	3D	130
	4D	34
	Accesibles	8
N. Plazas		287
N. Trasteros		0
N. Locales		2

CALENDARIO

Licencia Obra	13/03/2024	✓
Calificación Provisional	25/06/2024	✓
Aprobación Proyecto Ejecución	30/04/2024	✓
Licitación Obra	22/07/2024	✓
Adjudicación Obra	24/10/2024	✓
Formalización Contrato Obra	04/12/2024	✓
Acta Inicio de la Obra	02/01/2025	✓
Certificado Final Obra		✗
Calificación Definitiva		✗
Licencia Primera Ocupación		✗
Recepción de Obra		✗

HITOS

Cumplimientos

Ejecución pilotes en C/Perseo: en proceso

I.O

C.I

F.E

F.F

F.D

F.O

✓

!

!

!

!

!

I.O (Inicio Obra)

C.I (Fin Cimentación)

F.E (Fin Estructura)


F.F (Fin Fachadas)

F.D (Fin Distribuciones)

F.O (Final Obra)

DESARROLLO DE LA OBRA

AVANCE DE LA OBRA

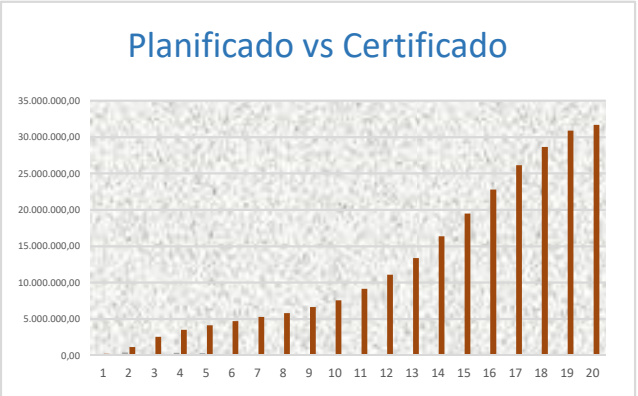

PORCENTAJE AVANCE DE OBRA 3,98%

PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA 13,06%

