

PROMOCION DE 71 VIVIENDAS VPPA EN MÓSTOLES

FINANCIACIÓN PRTR

28,65%

RESUMEN DE MAYO-2025

INFORMACION GENERAL OBRA

PARCELA FR 81 - PAU 4 DE MÓSTOLES

Superficie Parcela	1.716,00 m2
Superficie Construida	8,541,49m2
Sobre rasante	5.329,73 m2
Bajo rasante	3.211,76m2
Presupuesto (i/iva)	12.020.059,58 €
Inversión total actuación	12.518.547,96 €
Plazo en meses	26
Contratista	
N. Viviendas	71
	1D 22
	2D 27
	3D 10
	4D 8
	Accesibles(2D+3D) 2+2
N. Plazas	78
N. Trasteros	71
N. Locales	0

CALENDARIO

Licencia Obra	15/03/2024	✓
Calificación Provisional	03/04/2024	✓
Aprobación Protecto Ejecución	29/04/2024	✓
Licitación Obra	22/07/2024	✓
Adjudicación Obra	24/10/2024	✓
Formalización Contrato Obra	26/11/2024	✓
Acta Inicio de la Obra	02/01/2025	✓
Certificado Final Obra		✗
Calificación Definitiva		✗
Licencia Primera Ocupación		✗
Recepción de Obra		✗

HITOS

Cumplimientos


I.O	C.I	F.E	F.F	F.D	F.O
✓	!	!	!	!	!

I.O (Inicio Obra)
C.I (Fin Cimentación)
F.E (Fin Estructura)
F.F (Fin Fachadas)
F.D (Fin Distribuciones)
F.O (Final Obra)

DESARROLLO DE LA OBRA

AVANCE DE LA OBRA

FOTO

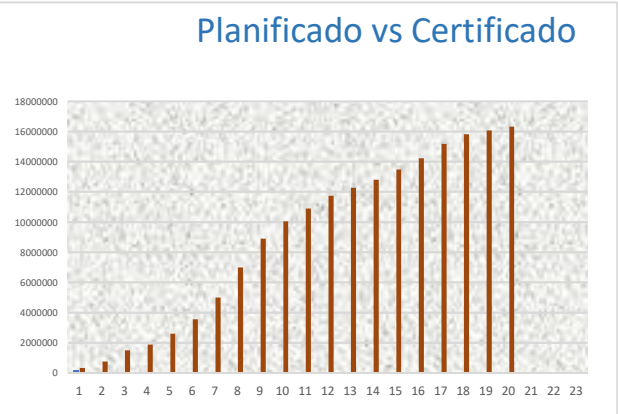

PORCENTAJE AVANCE DE OBRA 7,86%
PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA 13,95%
